PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

ECO 5 RD

INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE PROYECTOS

T3- JULIO– SEPTIEMBRE 2026

Construcción de Infraestructura para la Disposición Final de Residuos Sólidos en Nagua
CÓDIGO SNIP 14609

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Octubre 2026

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Dentro del portafolio de Programas y Proyectos de la División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos del Departamento de Planificación y Desarrollo de la Unidad Ejecutora ECO5RD se contempla la operación de Inversión Pública vigente bajo la sombrilla del "Programa de Intervención Nacional de los Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos".

Su objetivo es impulsar como política pública la mejora de la calidad de vida de la población y el medioambiente a través de manejo adecuado de los residuos sólidos. Este programa está alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en el eje estratégico 4, a los objetivos de desarrollo sostenible ODS y se alinea al Plan Plurianual del Sector Público en su estrategia 25.2.

Los proyectos de programa conciben una serie de actividades enfocadas a proveer a la población un eficiente sistema de disposición final de residuos sólidos que garantice un mejor manejo y control de la vida útil del punto de disposición final de residuos sólidos preservando el medioambiente de una manera sostenible. Estos proyectos consisten en la construcción de infraestructuras para el mejoramiento, normalización y disposición final de los residuos sólidos

Dentro de las actividades de producción se efectúan procedimientos como: excavaciones, movimiento de material, adecuación del terreno, colocación de membranas impermeables, compactación de los residuos, nivelación, mejoramiento del terreno con arcilla, instalación de medios para la captación de gases y recolección de lixiviados.

Para el año 2026, el programa dispone de la aprobación de ocho proyectos por parte de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Planificación y Desarrollo, de los cuales siete se encuentran en ejecución y uno está programado para iniciar, según se detalla en la siguiente tabla:

Nombre del Proyecto	Código SNIP	Monto de Inversión Aprobado 2026	Estatus	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Construcción de Infraestructura para la Disposición Final de Residuos Sólidos en Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez	14609	6,957,845.00	En Ejecución	2024	2026
Construcción de Infraestructura para la Disposición Final de Residuos Sólidos en Samaná	14617	11,121,183.00	En Ejecución	2024	2027
Construcción Centro de Mantenimiento y Operaciones Logísticas para equipos pesados de ECO5RD en Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo	16946	79,927,189.22	Pendiente de Inicio	2026	2028
Construcción de Relleno Sanitario en el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel	16804	36,286,145.57	En ejecución	2025	2027
Construcción de Estación de Transferencia de Residuos Sólidos en el municipio de Mao, Provincia Valverde	17099	54,773,564.46	En ejecución	2026	2027
Construcción de Estación de Transferencia de Residuos Sólidos para los distritos municipales Hato del Yaque y La Canela, Provincia Santiago	17128	57,247,114.98	En ejecución	2026	2027

Nombre del Proyecto	Código SNIP	Monto de Inversión Aprobado 2026	Estatus	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Construcción de Estación de Transferencia de Residuos Sólidos en el municipio de Guayubín, provincia Monte Cristi	17163	87,767,832.79	En ejecución	2026	2027
Construcción de Relleno Sanitario para la Disposición final de Residuos Sólidos en el municipio San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodriguez	17214	22,581,624.98	En ejecución	2026	2027

1. Construcción de infraestructura para la disposición final de los residuos sólidos en Nagua

Objetivo del proyecto: Disponer de un adecuado sistema de captación y transferencia de los volúmenes de desechos sólidos residenciales producidos en este territorio.

Objetivos específicos

- Disposición de un sitio para la Transferencia de los desechos sólidos
- Habilitación de celdas para la captación de volúmenes de desecho.
- Habilitación de canales de conducción de lixiviados.
- Colocación de membranas impermeables para captación de lixiviados
- Instalar dispositivos de extracción/ liberación de gases.
- Planificar y organizar el manejo de los residuos sólidos.
- Diseñar un mecanismo de operación para la colocación de los desechos por celdas y separados por capas.
- Construir infraestructuras para el pesado de los camiones.
- Crear un sistema que regule los trabajos que realizan los intermediarios y segregadores o recuperadores informales.
- Manipular Adecuadamente los residuos sólidos en los sitios de disposición final.

Población Beneficiaria: 76,993

Componentes:

- Obra física.
- Supervisión e inspección de obras.
- Equipamientos de oficinas.
- Maquinarias y equipos pesados.
- Capacitación.

1.1. Seguimiento a la ejecución del proyecto

El seguimiento se realiza basado en los informes enviados por el Departamento de Proyectos e Infraestructuras Eco-Amigables (PIEA), que detallan el progreso a la fecha por cada componente bajo su responsabilidad. Al cierre del mes de septiembre, el proyecto presenta los siguientes avances:

- ✓ Culminación de las obras civiles contempladas en el proyecto.
- ✓ Puesta en operación de la Estación de Transferencia, con la ejecución de las actividades de pesaje, registro y despacho de los residuos sólidos.
- ✓ Se encuentra adjudicado la construcción de la verja perimetral para la estación de transferencia.
- ✓ Se realizó una visita de seguimiento para evaluar las condiciones operativas de las instalaciones, verificándose limitaciones en los procesos de transferencia y traslado de residuos debido a la falta de equipos, por lo que se debe mejorar para optimizar la gestión de los residuos sólidos.

A la fecha se refleja el porciento de ejecución financiera acumulada:

Código SNIP	Monto de Inversión RD$	Monto Componente Obra Física	Ejecución Acumulada en RD$	% de Ejecución Financiera Acumulada
14609	6,957,845.00	6,065,154.00	0	0%












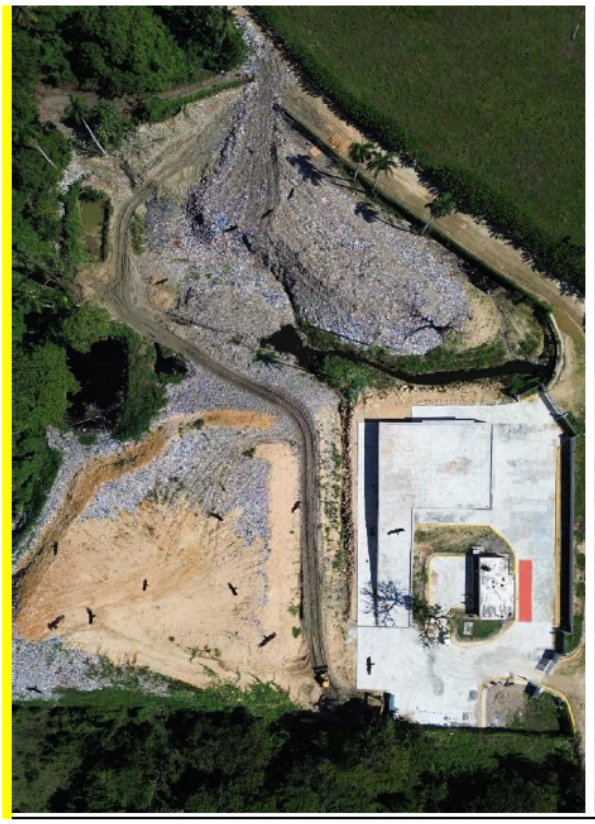




BLOQUE DE APROBACIÓN		
ELABORADO POR	**CARGO**	**FECHA**
Eva Esther Luna Tavarez	Analista de Proyectos	08/10/2026
REVISADO POR	**CARGO**	**FECHA**
Luis Pérez Ripol	Encargado de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	08/10/2026
APROBADO POR	**CARGO**	**FECHA**
Kenny Fabián	Encargado de Planificación y Desarrollo	08/10/2026

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ECO 5 RD
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
